
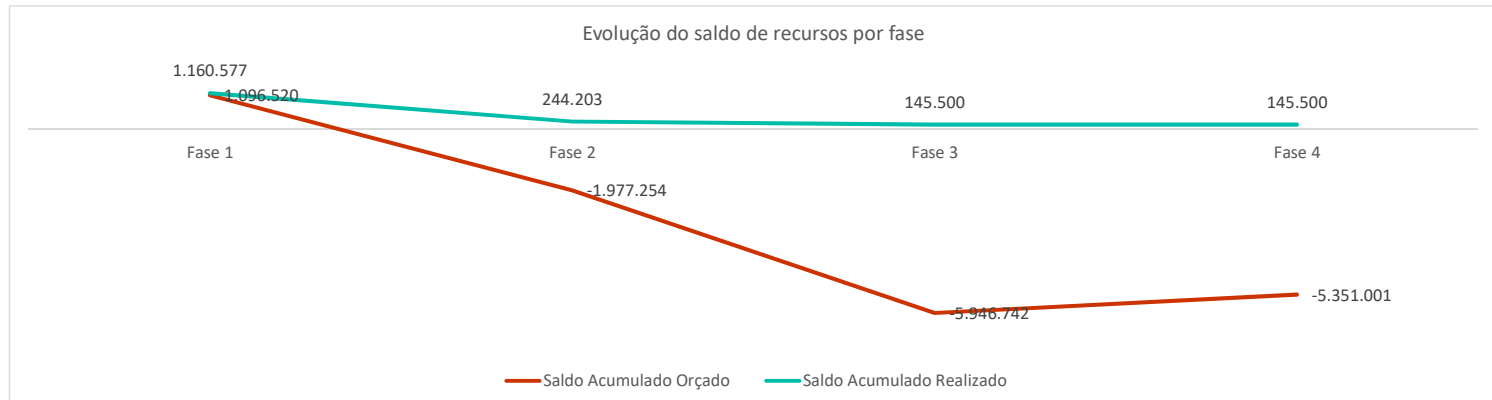
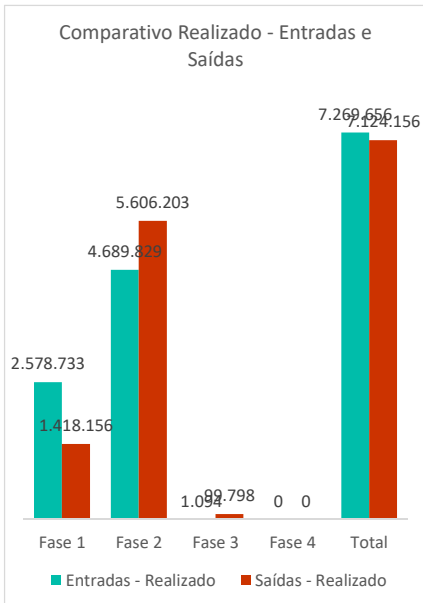
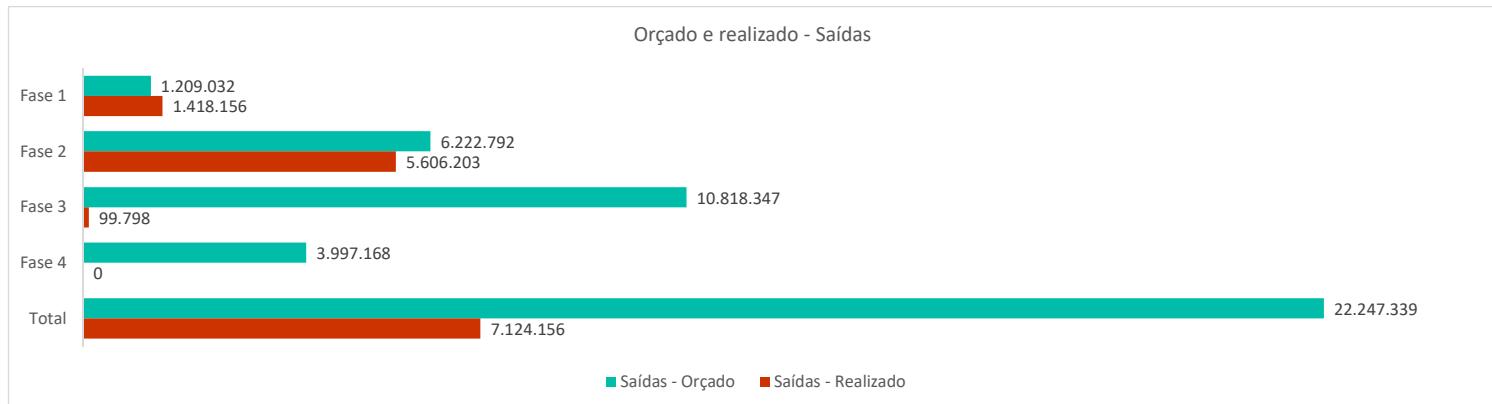
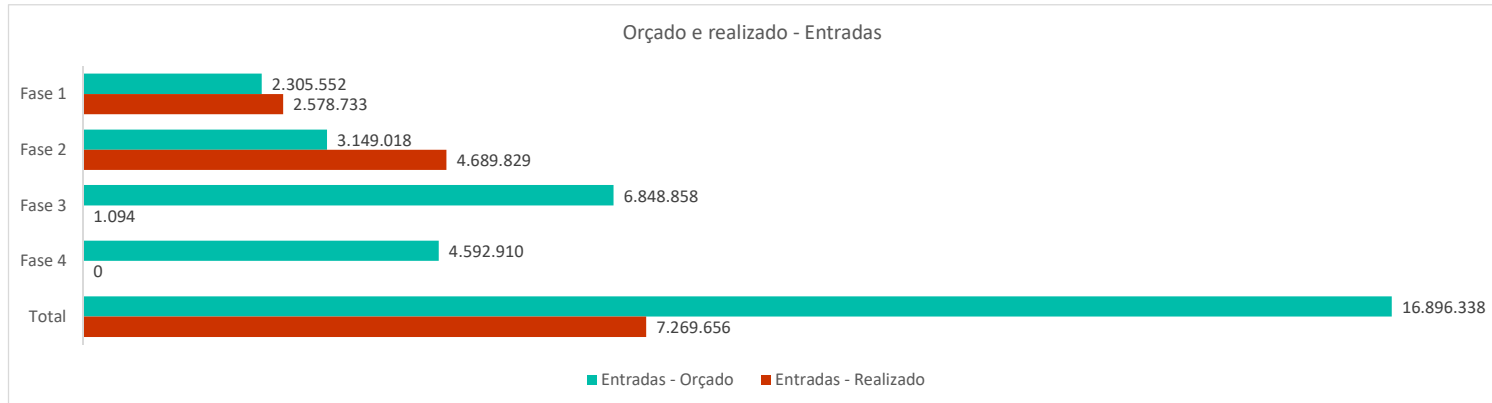


	FASE 1		FASE 2		FASE 3		FASE 4		TOTALS	
	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado
ORÇAMENTO DE ENTRADAS - ORIGEM DOS RECURSOS										
SALDO INICIAL	0	0	1.096.520	1.160.577	-1.977.254	244.203	-5.946.742	145.500	0	0
148009 Receitas Obra Sede Nova - A Vista	1.432.038	1.327.935	83.500	54.115	0	140	0	0	1.515.538	1.382.190
148108 Doações Obra Sede Nova – Parceladas	607.090	842.155	2.800.000	2.885.787	0	0	4.592.910	0	8.000.000	3.727.942
148105 Doações Obra Sede Nova – Cartão de Crédito	266.424	346.022	265.518	159.213	0	0	0	0	531.942	505.235
148182 Descontos Obtidos Obra	0	564	0	1.324	0	0	0	0	0	1.888
148304 Precatório Justiça Federal - CP e PIS	0	0	0	1.443.866	4.638.621	0	0	0	4.638.621	1.443.866
145610 Emenda Parlamentar	0	0	0	0	2.210.237	0	0	0	2.210.237	0
148189 Rendimentos Bancários - Obra	0	31.561	0	9.218	0	954	0	0	0	41.733
148204 Renúncia Fiscal INSS - OBRA	0	2.446	0	1.689	0	0	0	0	0	4.136
148164 Renúncia Fiscal ISS - OBRA	0	28.051	0	134.616,84	0	0	0	0	0	162.667
Total Entradas - Origens	2.305.552	2.578.733	3.149.018	4.689.829	6.848.858	1.094	4.592.910	0	16.896.338	7.269.656
ORÇAMENTO DE SAÍDAS - DESTINO DOS RECURSOS										
148179 Água e Esgoto	0	-135	0	-6.123	0	-210	0	0	0	-6.468
148036 Bens de Pequeno Valor	0	-2.074	0	-3.660	0	0	0	0	0	-5.735
148012 Cobertura	0	0	0	0	-268.824	0	0	0	-268.824	0
148031 Combustíveis e Lubrificantes	0	-100	0	-534	0	0	0	0	0	-634
148167 Elevadores	-441.000	-441.000	0	-18.243	0	0	-155.000	0	-596.000	-459.243
148173 Energia Elétrica	0	-149	0	-1.621	0	0	0	0	0	-1.770
148016 Esquadrias, Portas e Janelas	0	0	0	0	-78.000	0	-98.000	0	-176.000	0
148180 Ferramentas	0	-2.762	0	-2.344	0	0	0	0	0	-5.106
148014 Forros e Complementos	0	0	0	0	-123.000	0	0	0	-123.000	0
148018 Iluminação	0	0	0	0	0	0	-165.000	0	-165.000	0
148017 Sistema Pré-Tratamento Água	0	0	0	0	-622.000	0	0	0	-622.000	0
148023 Instalações de Climatização	0	0	0	0	-1.229.884	-82.659	-330.636	0	-1.560.520	-82.659
148019 Instalações Elétricas	-12.000	-2.981	0	-11.973	-2.676.012	0	0	0	-2.688.012	-14.954
148020 Instalações Hidráulicas	0	-1.309	-24.400	-5.703	-774.000	0	0	0	-798.400	-7.012
148021 Infraestrutura Dados e Lógica	0	0	0	0	-320.510	0	-478.800	0	-799.310	0
148024 Instalações Provisórias	-139.399	-1.759	-295.042	-3.784	0	0	0	0	-434.441	-5.543
148035 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1.100	-2.690	-1.600	-191.165	-1.700	-15.176	-2.180	0	-6.580	-209.031
148022 Louças, bancadas, espelhos e Acessórios	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0
148013 Material De Construção	0	-178.705	-1.603.083	-1.458.219	-2.520.000	-936	-480.000	0	-4.603.083	-1.637.860
148166 Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0
148117 Outros Gastos Operacionais	0	-1.874	0	-5.348	0	0	0	0	0	-7.222
148039 Pintura	0	0	0	0	-156.000	0	0	0	-156.000	0
148015 Pisos e Revestimentos	0	-88	0	0	-830.943	0	-398.552	0	-1.229.495	-88
148025 Assessoria Projetos	-26.000	-10.384	-265.000	-405.255	0	-318	0	0	-291.000	-415.957
148097 Salários, Encargos e Benef MDO Própria	-23.400	-24.011	-44.400	-40.613	-54.600	0	-39.000	0	-161.400	-64.625
148034 Seguros	-10.453	-2.683	0	-8.155	0	-35	0	0	-10.453	-10.873
148027 Serviços de Terceiros P.J	-403.922	-612.551	-3.966.454	-3.431.186	-1.162.873	-422	-1.100.000	0	-6.633.248	-4.044.159
148188 Tarifas Obra Sede Nova	0	-86	0	-601	0	-42	0	0	0	-729
148113 Tarifas Semana D	-22.890	-15.008	-22.812	-6.562	0	0	0	0	-45.703	-21.570
147998 Assessoria Gestão Charidy	-128.868	-117.806	0	0	0	0	0	0	-128.868	-117.806
Total Saídas - Destinos	-1.209.032	-1.418.156	-6.222.792	-5.606.203	-10.818.347	-99.798	-3.997.168	0	-22.247.339	-7.124.156
SALDO FINAL	1.096.520	1.160.577	-1.977.254	244.203	-5.946.742	145.500	-5.351.001	145.500	-5.351.001	145.500

PAINEL DE CONTROLE - GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS DAS FASES DA OBRA

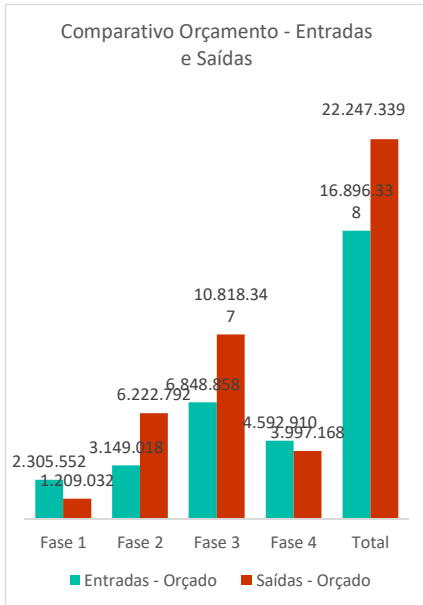

* Fonte: Controladoria Renal Vida
